

**Lahti**

***Aleksin saneeraus  
ja pysäkkikokeilun toimenpiteet  
- työnaikaiset järjestelyt***

10.4.2026

Juhana Polojärvi  
Riitta Niskanen  
Petteri Väisänen

# Aleksanterikadun ajoradan tilapäinen asfaltointi ja pysäkkikokeilun toteuttaminen kesällä 2026

**Kaupunkiympäristölautakunta 18.11.2025 :**

Aleksanterikadun ajorata välillä Rauhankatu –  
Vesijärvenkatu sekä Aleksanterinkatu – Vesijärvenkatu  
liittymäalue peruskorjataan tilapäisesti enintään 5 vuodeksi  
korvaamalla nykyinen noppakivipinta asfaltilla

Aleksanterinkadun osuus toteutetaan **4.6. – 19.6.** välisenä  
aikana

**Kaupunkiympäristölautakunta 16.12.2025 :**

Vesijärvenkadulle toteutetaan pysäkit Pysäkkikokeilua  
varten. Kokeilu alkaa elokuussa 2026 ja toimintaa  
seurataan 1 vuosi → päätös pysäkkikeskuksesta v. 2027  
syksyllä




# Aleksanterinkadun ja kivien poisto ja asfaltointi ja pysäkkikokeilun pysäkit

**1. Vaihe: 3.6. – 19.6. Aleksis suljetaan autoliikenteeltä, työt alkavat 4.6.** ( 3.6. kk-markkinat)

Pelastusliikenne ja rajoitettu huoltoliikenne mahdollista jalankulkuväylien kautta

Työvaiheet: Aleksanterinkadun kivien poisto, pohjatyöt ja asfaltointi

Aleksanterinkadun pysäkin rakentaminen



**TYÖNAIKAISET POIKKEUSJÄRJESTELYT SEURAAVILLA KALVOILLA**

**2. Vaihe: Heinäkuun aikana, alkaa 1. vaiheen valmistuttua**


Vesijärvenkatu käytettävissä

Työvaiheet: Risteysalueen kivien poisto ja asfaltointi puoli kerrallaan, myös yötöinä

Kokeilupysäkkien rakentaminen poistaa Vesijärvenkadun reunakaistat käytöstä


Vaihe 1 rakentaminen:  
4.–19.6.

Vaihe 2  
1.8.  
mennessä

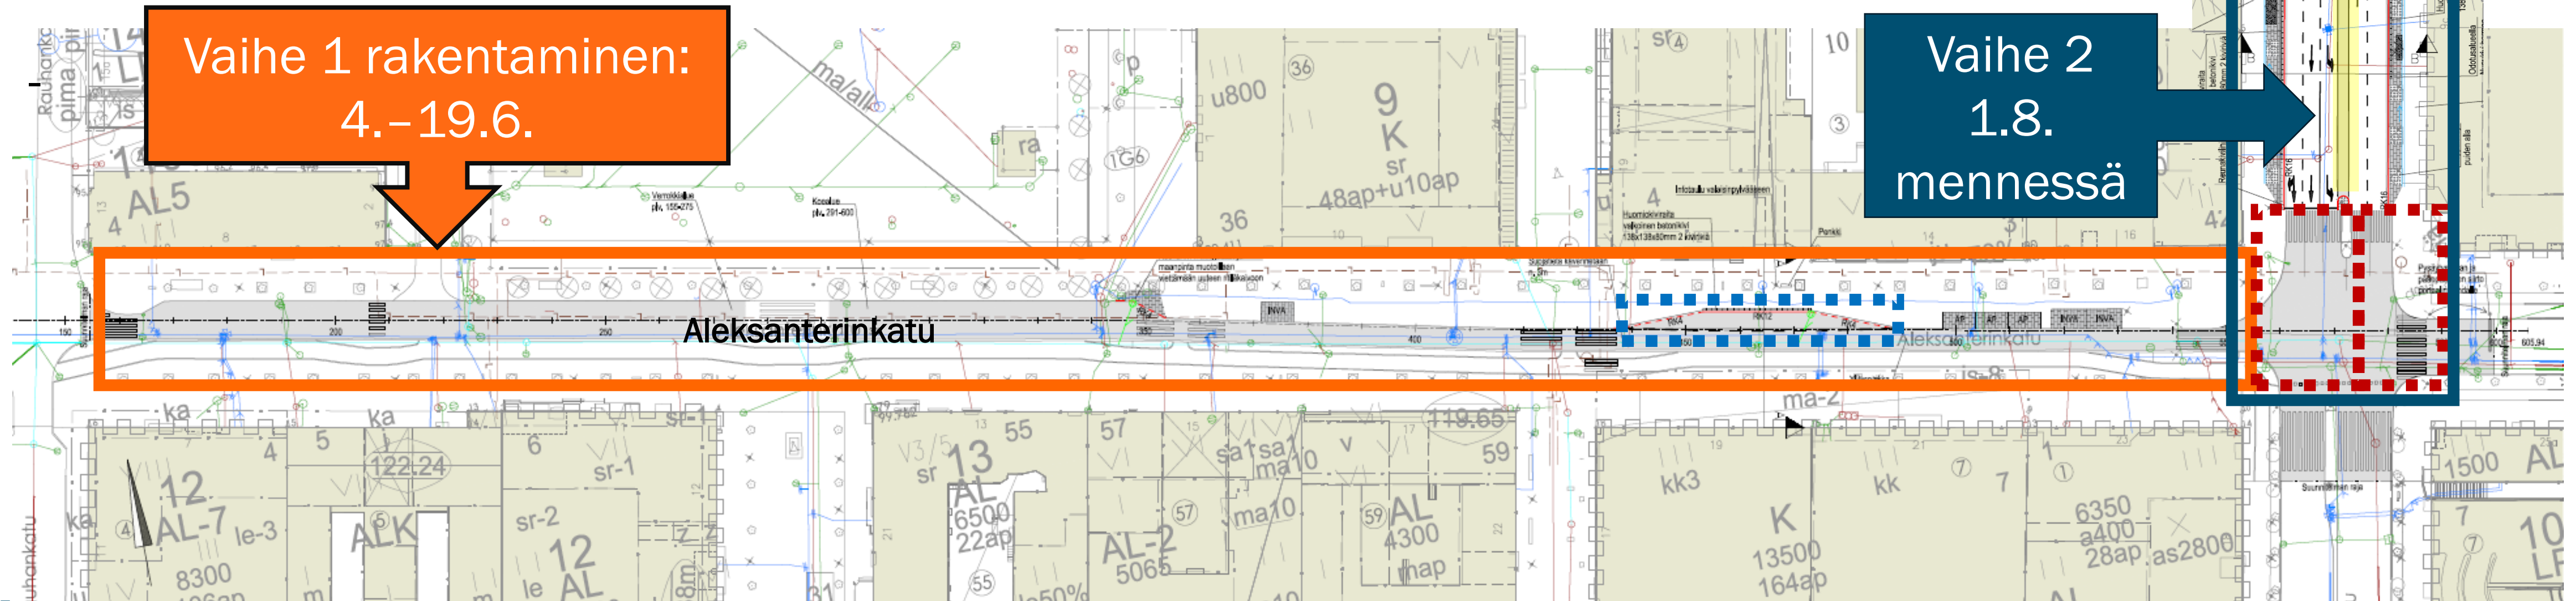


# PELASTUSAJO työmaan aikana

- Aleksin jk(pp)-väyliä pitkin, osin myös ajoradalta, kun murskepinta tiivistetty
- Rautatienkadulta molemmista suunnista

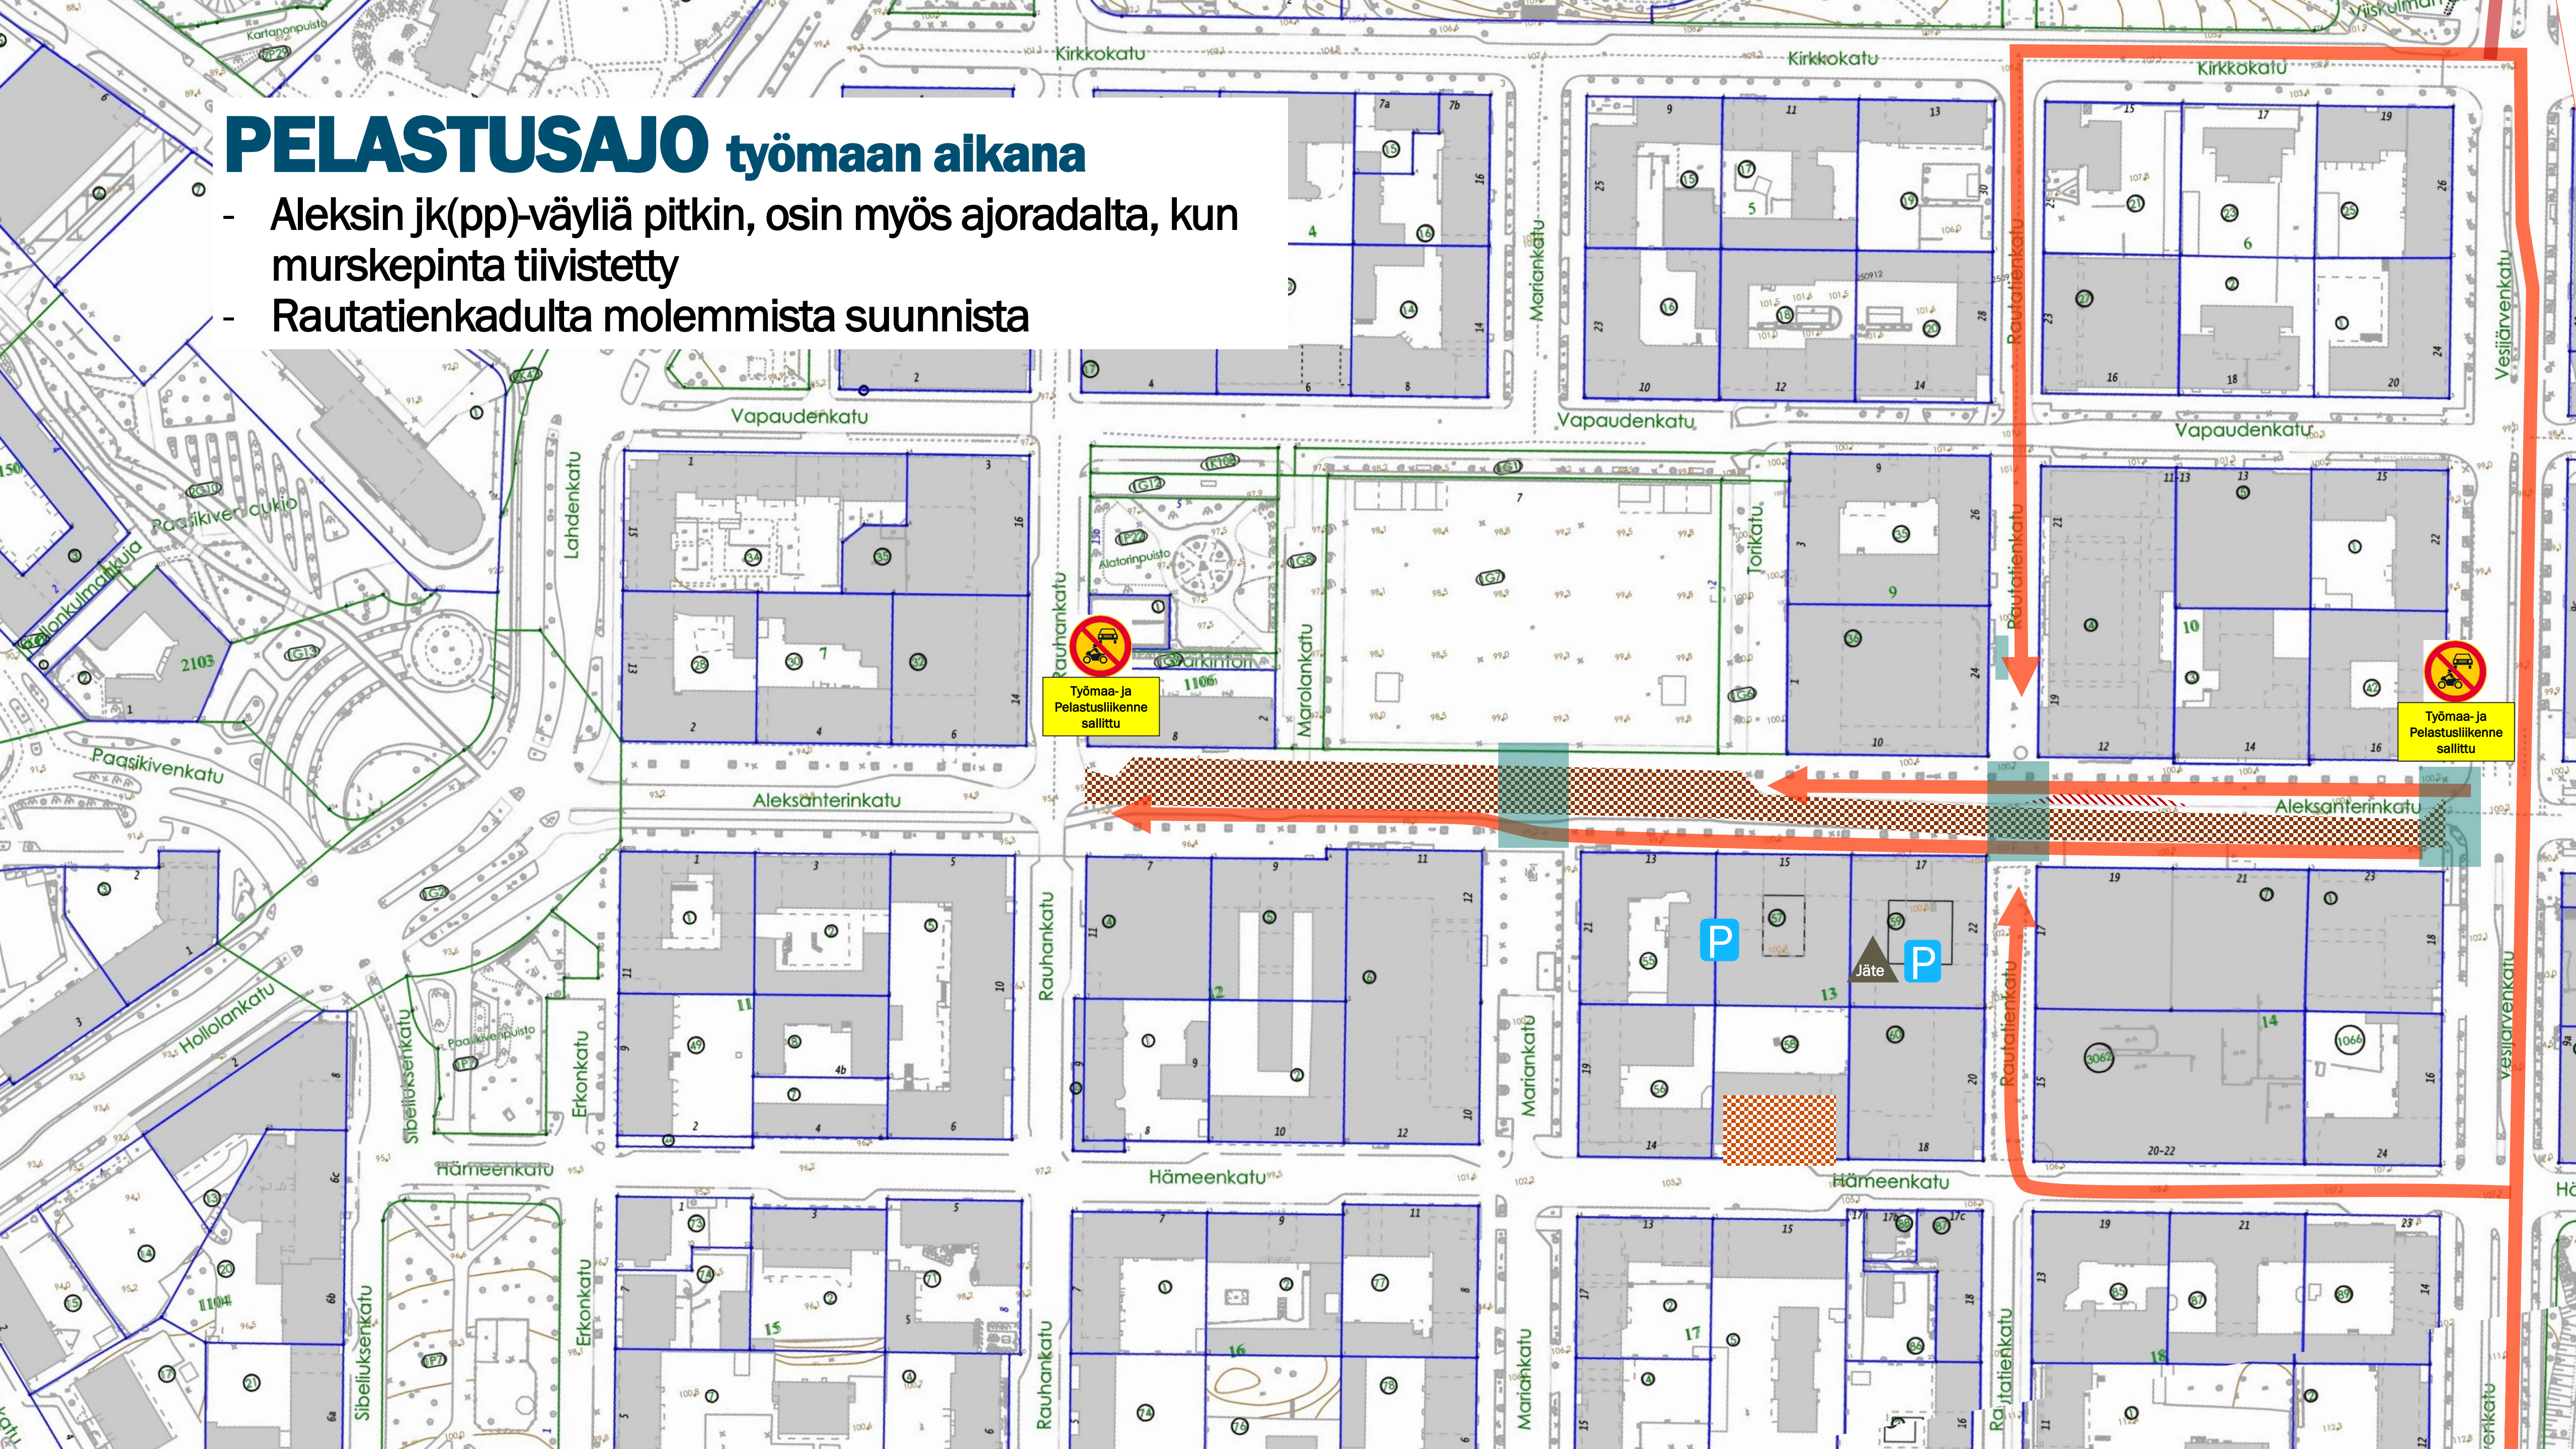

# HUOLTOLIIKENNE työmaan aikana

- Aleksilla aikarajoitettu huoltoajo esim. klo 5-8 jk(pp) väylillä
- Työmaa-alue aidataan kevyesti sen ajan ulkopuolella, jolloin aidat on helposti siirrettävissä pois hälytysajon tieltä
- Sokoksen huoltoliikenne pääsääntöisesti Hämeenkadun suunnasta
- Hämeenkadulle varataan ”huoltotaskuja”

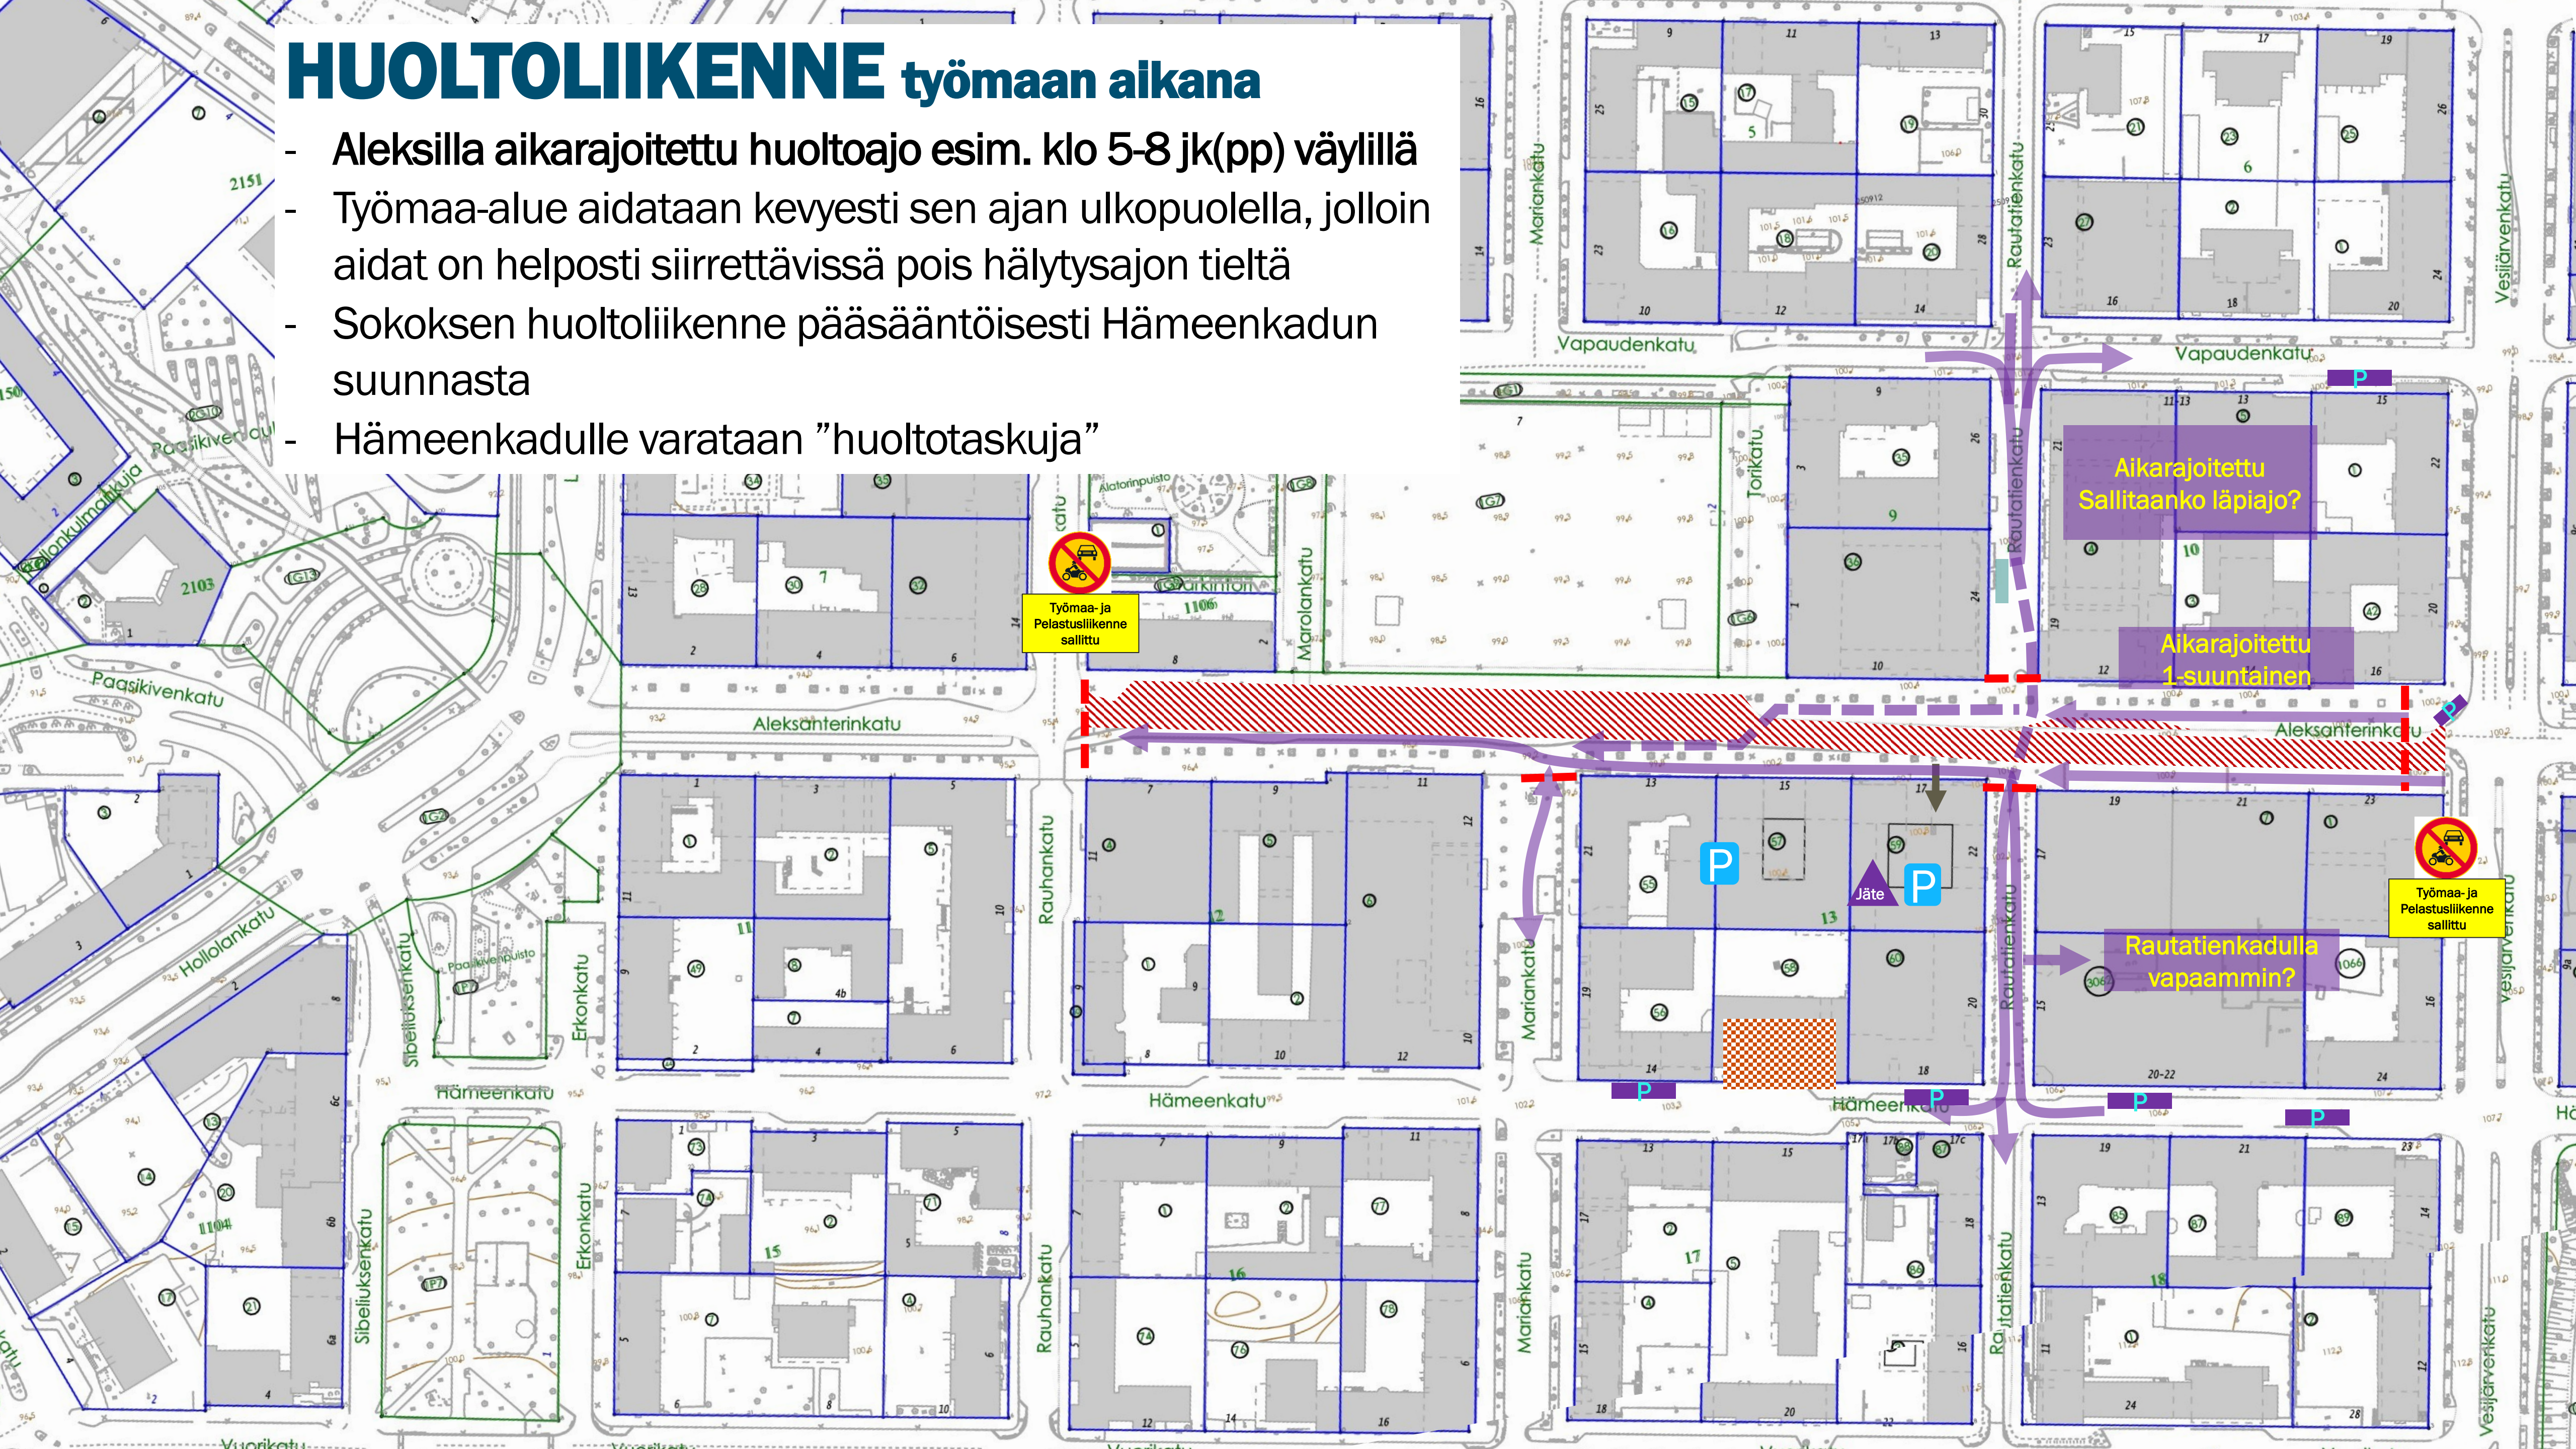

Työmaa- ja Pelastusliikenne sallittu

Aikarajoitettu Sallitaanko läpiajo?

Aikarajoitettu 1-suuntainen

Työmaa- ja Pelastusliikenne sallittu

Rautatiekadulla vapaammin?

Jäte

P

P

P

P

P

P


# TONTTILIKENNE työmaan aikana

- Vain välttämätön inva-liikenne mahdollista Aleksin kautta ja se sovittava erikseen ( yhteystiedot viimeisellä sivulla)
  - Aleksilla 2 pysäköintihallia
    - Toriparkin käyttö pysäköintiin remontin aikana ( sovitaan erikseen )
- Jätehuolto huoltoajan aikaikkunan mukaisesti




# TAKSIT JA TURISTIBUSSIT työmaan aikana

- Marolankatu käytössä Vapaudenkadun suunnasta
- Varataan takseille korvaavia paikkoja mm. Hämeenkadulta
- Tilausajopysäkki siirtyy Aleksanterinkadulle

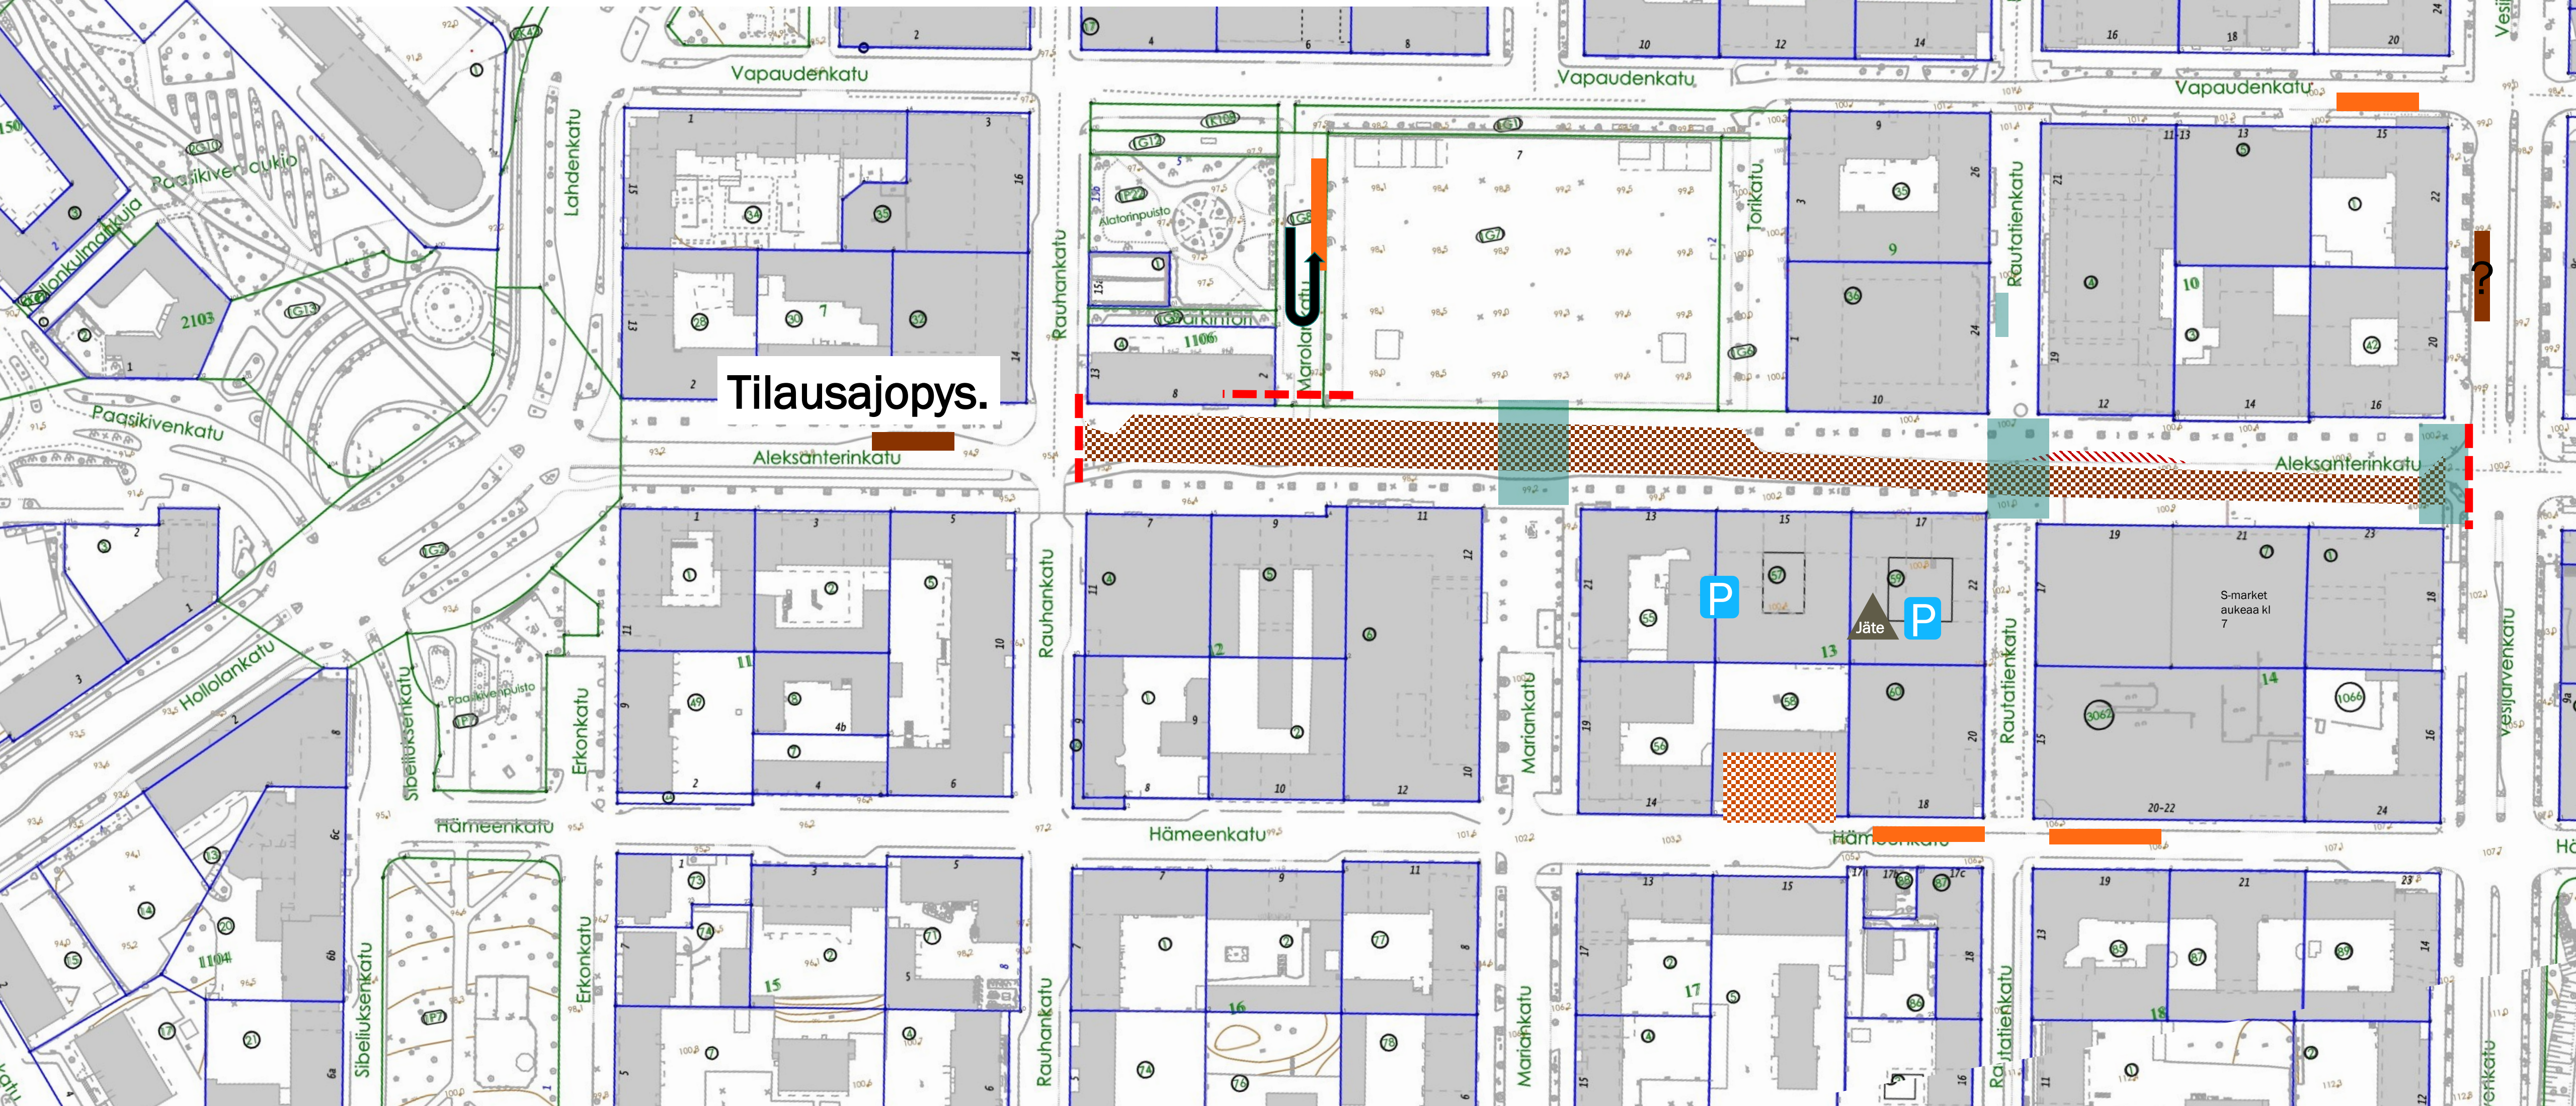


# Aleksanterinkadun asfaltointi remppa

- Nykyiset ajoradan kivet kerätään talteen, tilalle väliaikainen asfaltti ( kokeilu+vertailurakenne)

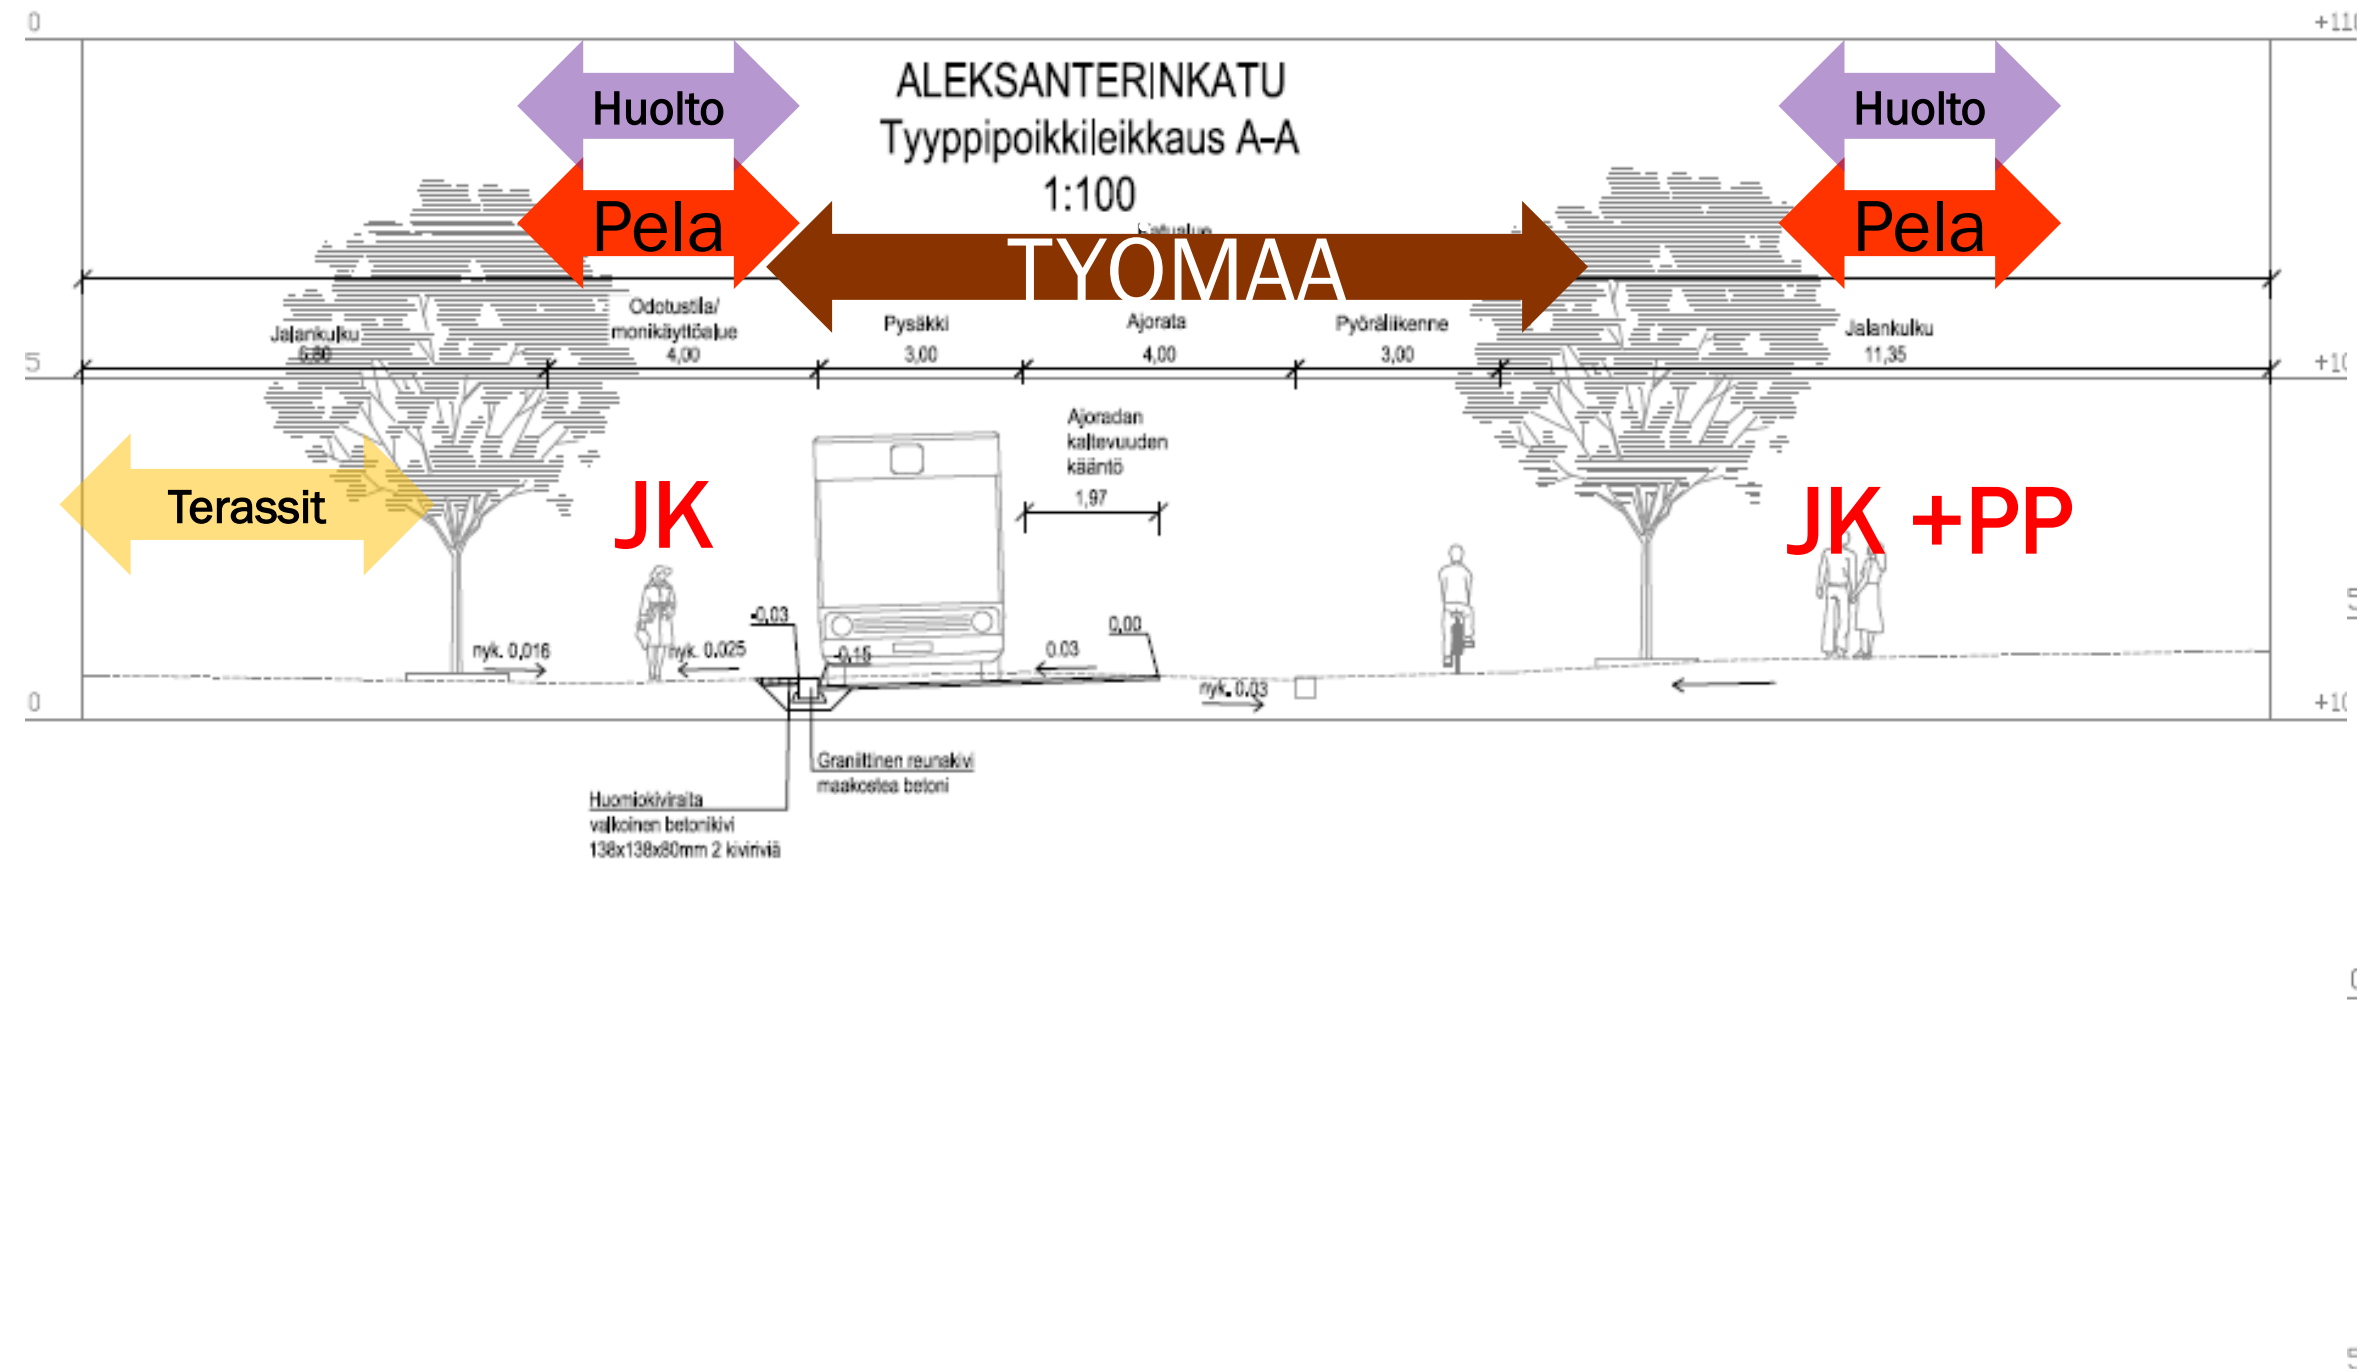


# Vesijärvenkadun kokeilupysäkit ja pelastusreitit


- Autoliikenne koko työmaan ajan mahdollista
- Toteutetaan ajoradan reunoille kokeilupysäkit ja poistetaan keskisaareke pelastusreittiä varten
- Kadun varren pelastusliikenne ; joko ajokaistan kautta tai pitäisikö varmistaa työmaa-alueen käyttö ?
- Huoltoliikenteelle paikat esim. Vapaudenkadulta tai Vesijärvenkadun reunalla kokeilupysäkkien työmaiden "ulkopuolella"

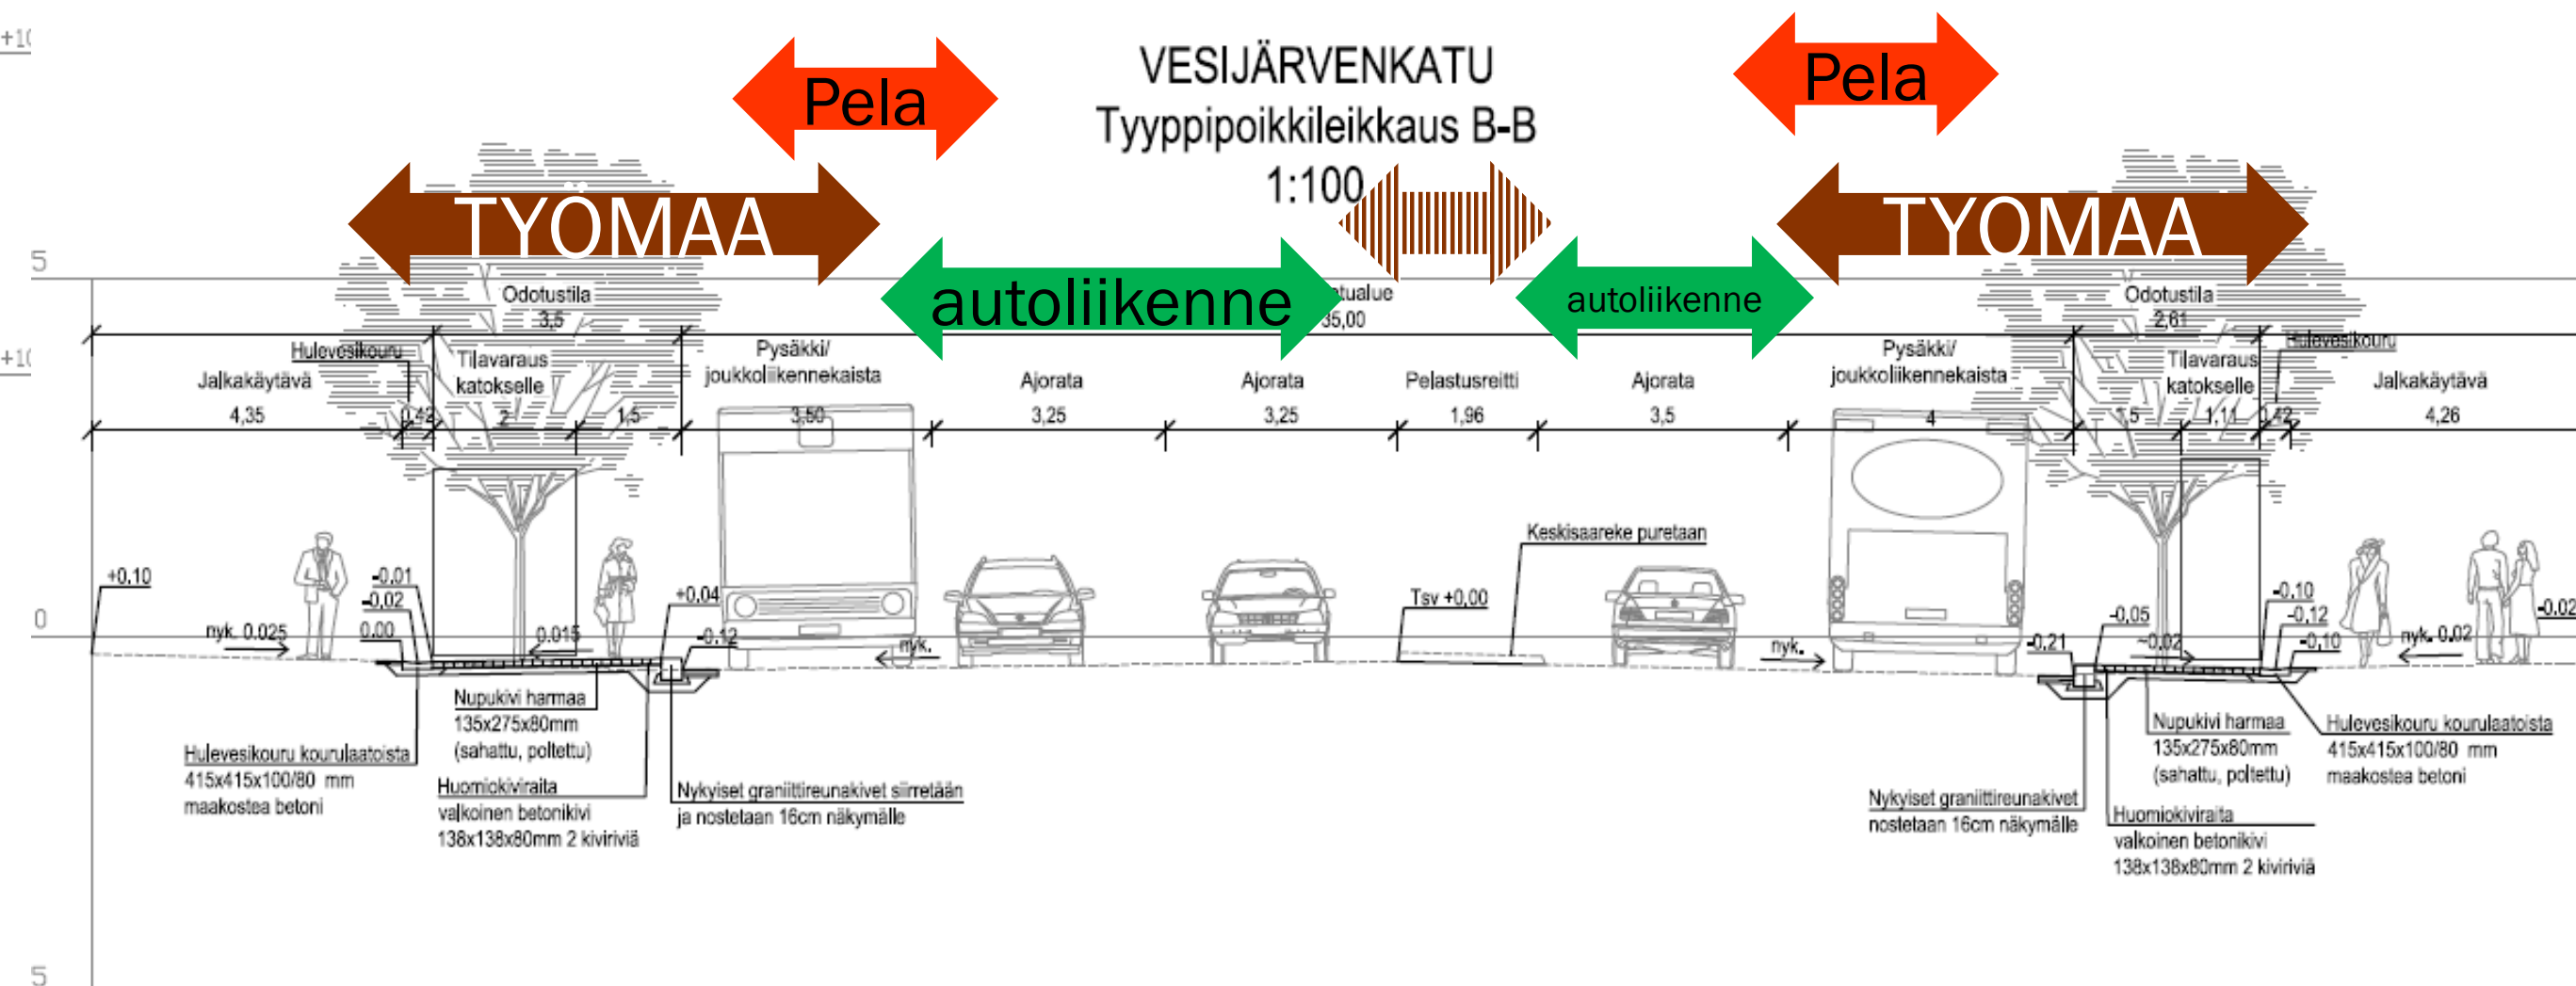

# Aleksin työmaa

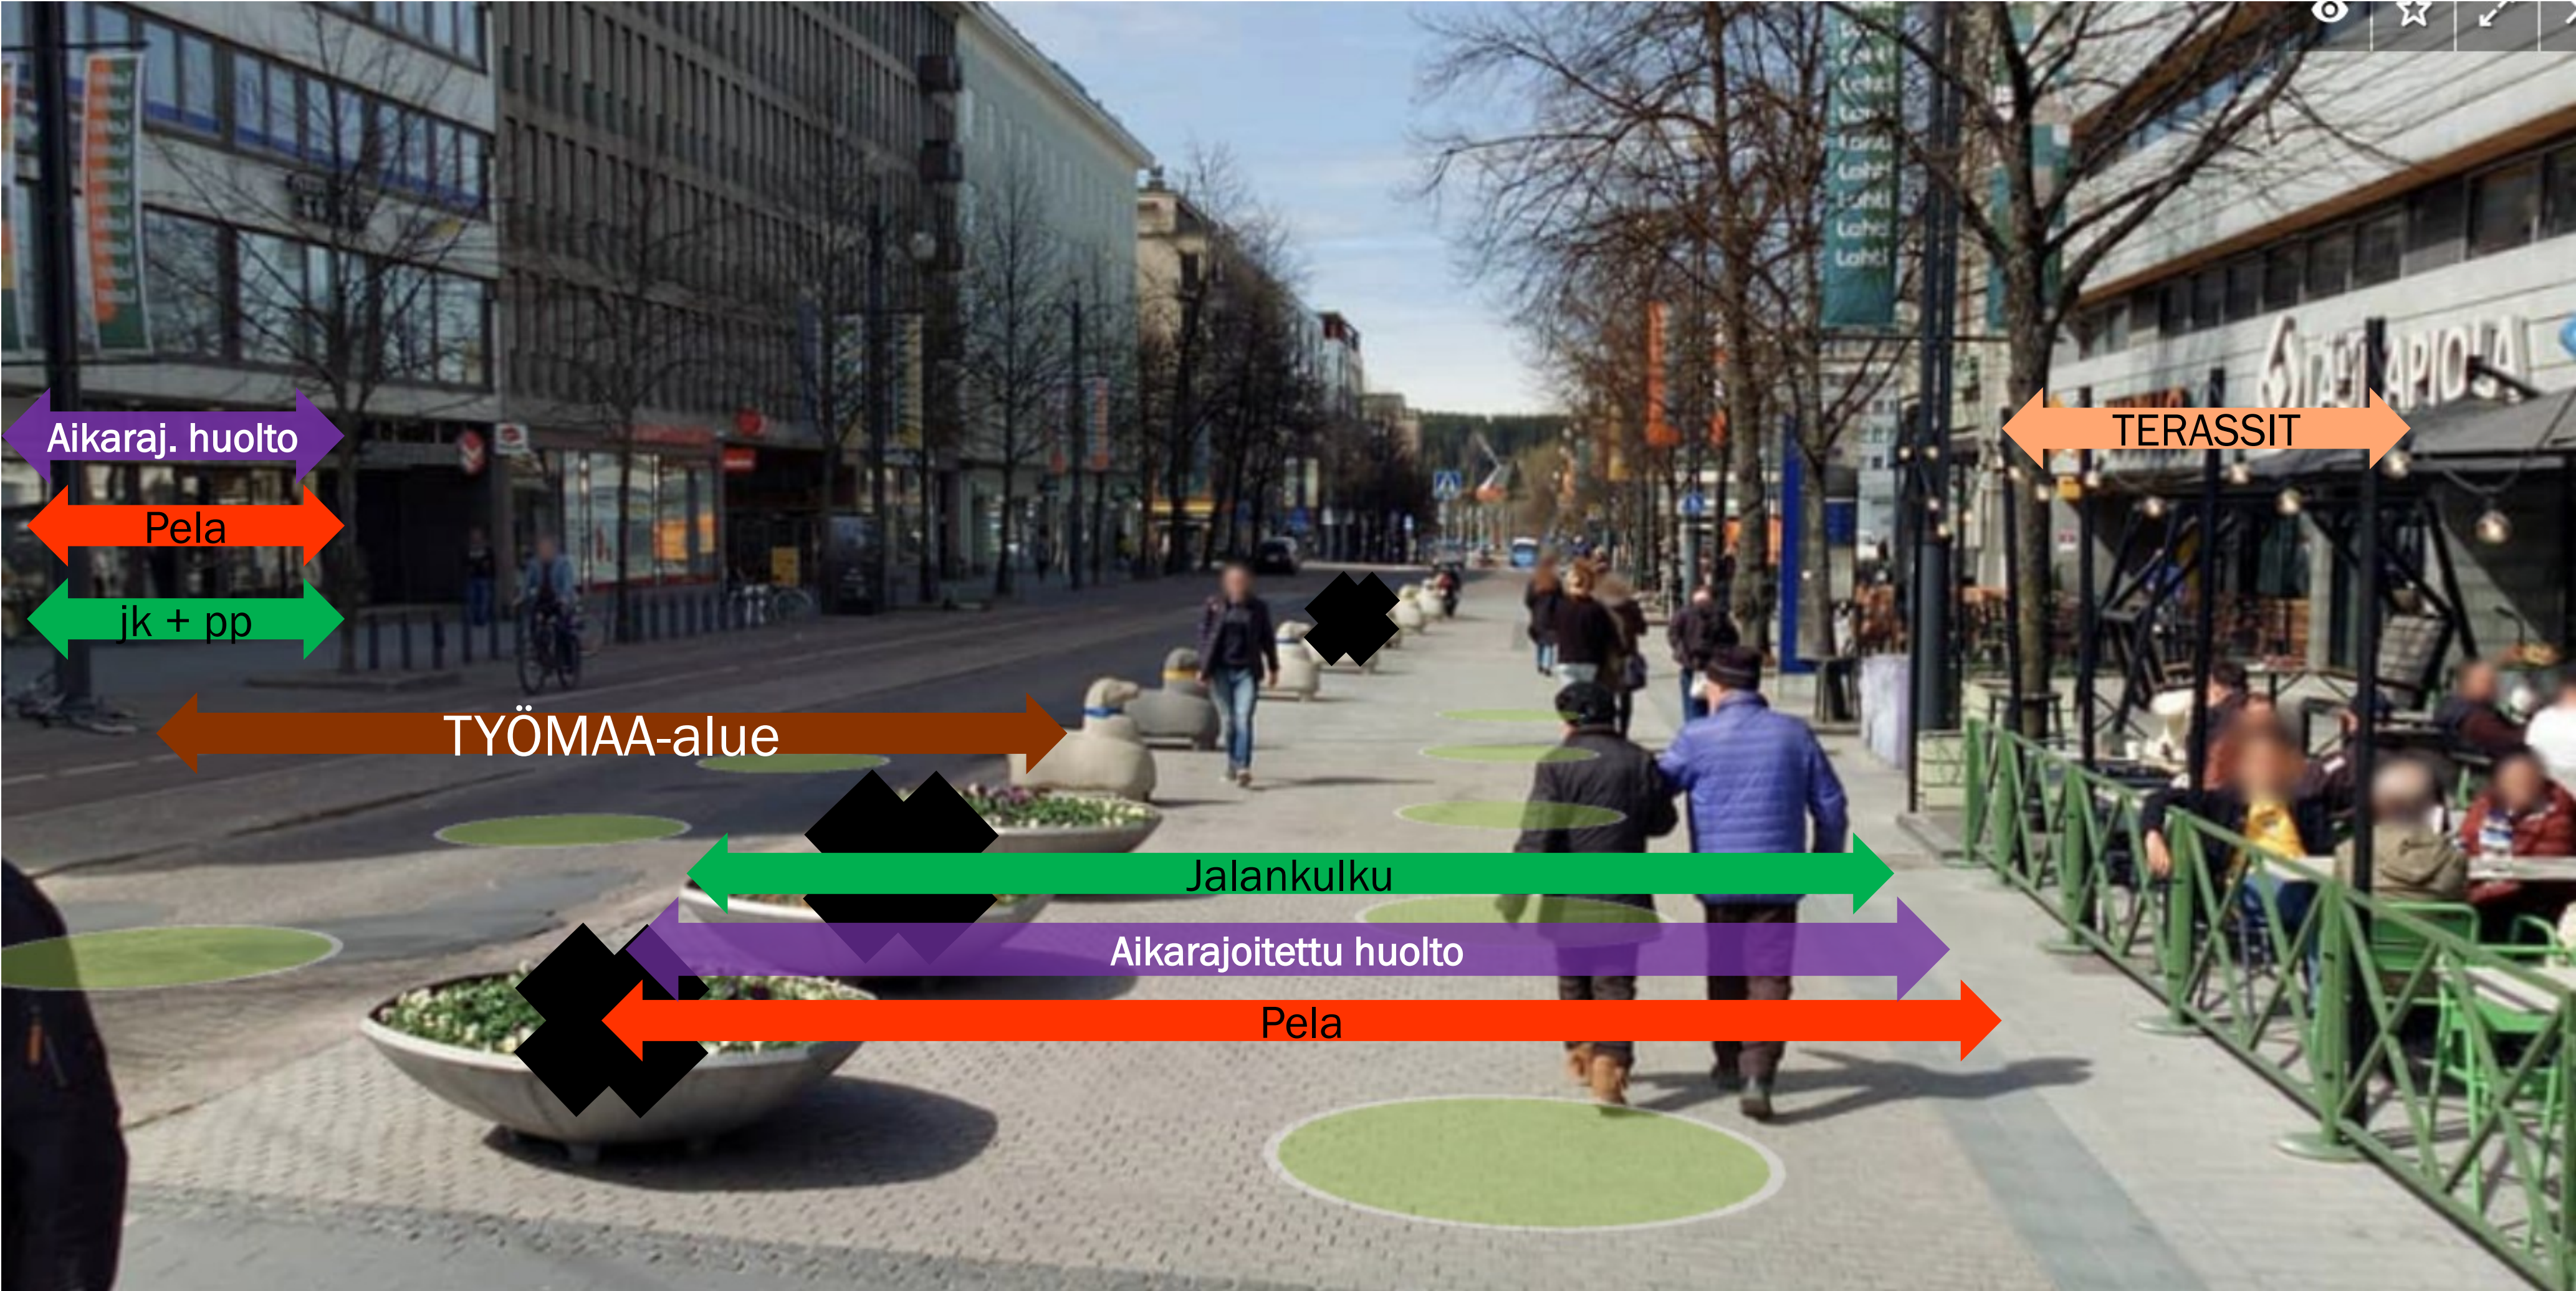

# Rautatienkadun reitti ja Sokoksen huolto

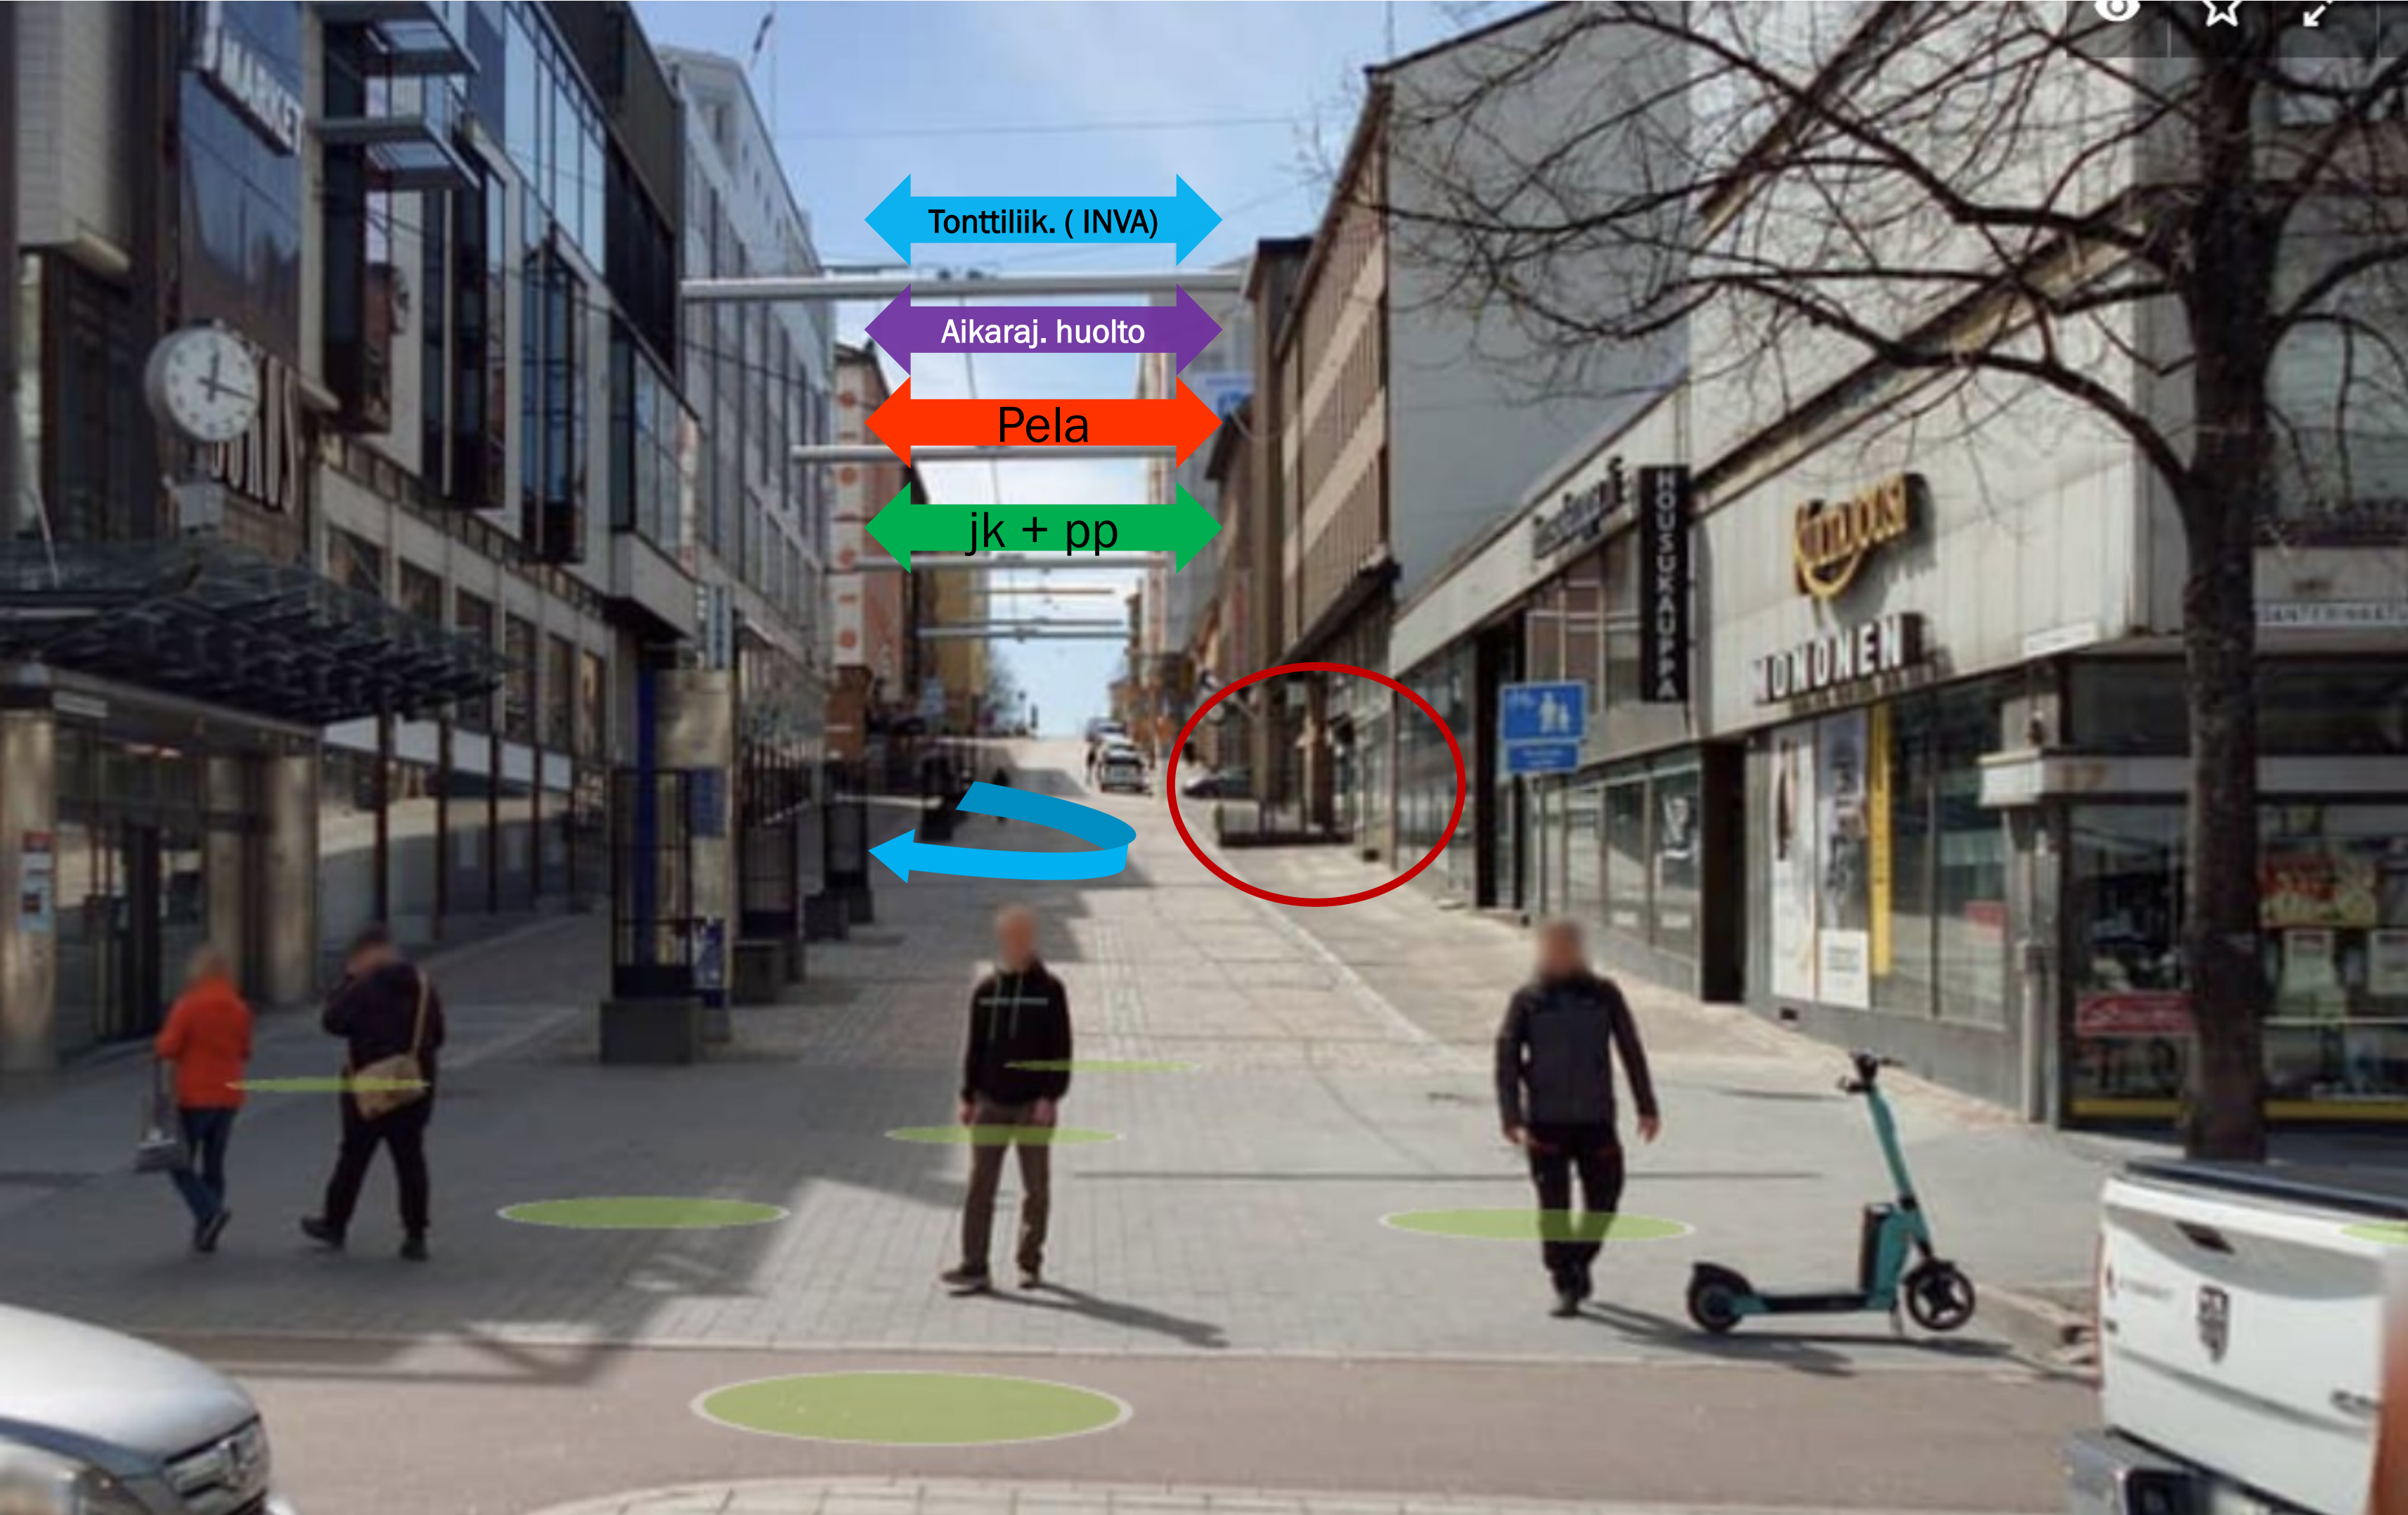


# Lanunaukio

- Lanunaukio on kävelyaluetta, jonne tonttiajo ja aikarajoitettu huoltoajo mahdollista vain Vapaudenkadun suunnasta
- Viherkeidas rakentuu aukion länsireunalle, jolloin vesialtaan itäpuolelle jää kulkuaukko pelastusreitiksi ( tehty koeajo 2025)
- Aleksanterinkadun remontin yhteydessä poikkeuksellisesti em. kulkuaukko toimii huoltoajon poistumisreitinä



# Korvaava bussireitti Hämeenkadulle

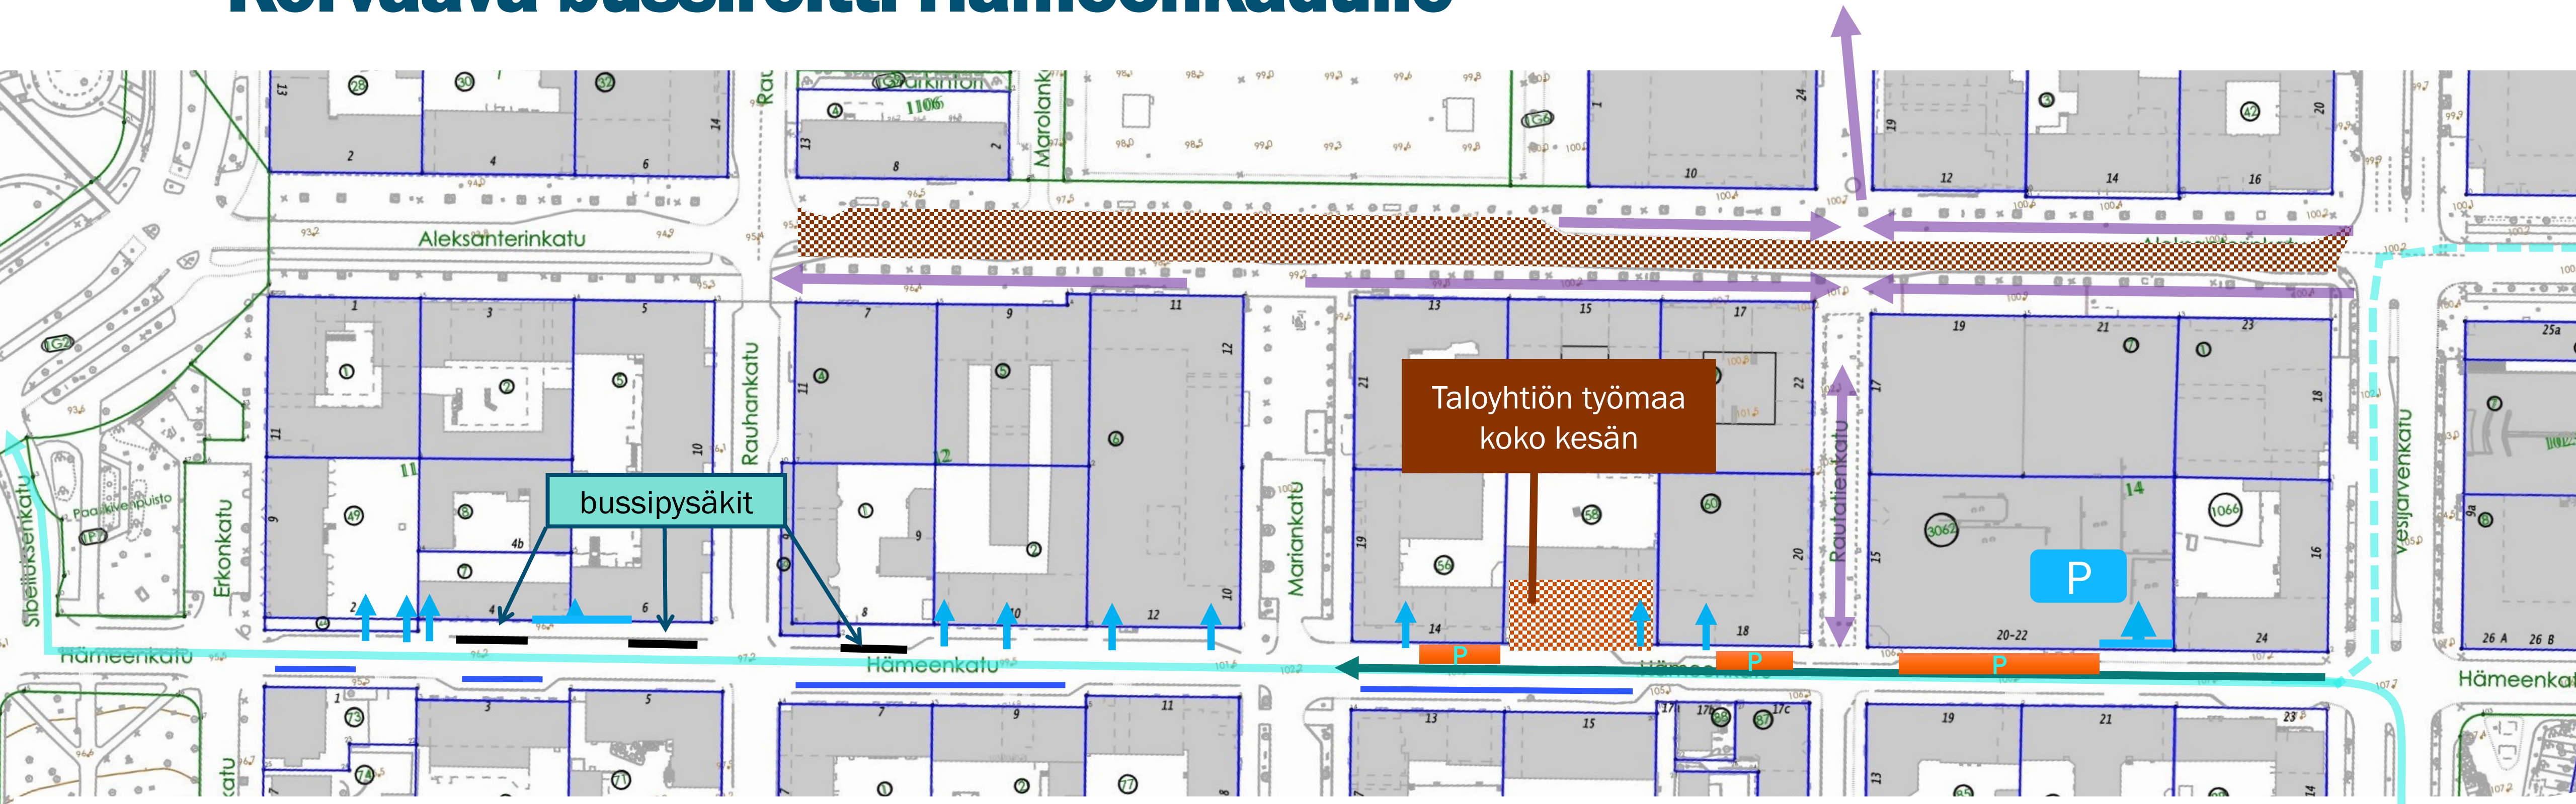

Hämeenkadun järjestelyt käyttöön 25.5. alkaen

Bussien liikennöinti Hämeenkadun kautta 1.6 -19.6. →

- Varmistetaan bussien liikennöinti muuttamalla katu yksisuuntaiseksi Vesijärvenkatu -> Mariankatu osuudella
- Kadunvarren pysäköintiä vähennetään ja vinopysäköintiä muutetaan kadunsuuntaiseksi
- Osa kadunvarsipaikoista ( Hämeenkadun pohjoisreunalla) muutetaan huolto- ja/tai taksikäyttöön
- Torin pysäkkejä korvaavat pysäkit Rauhankadun liittymän läheisyyteen

# Viestintä ja vuorovaikutus

- Suunnitelmat käyty läpi Poliisin, Pelastuslaitoksen kanssa
- ENNAKKOINFO yrittäjille ja kiinteistöille
  - maaliskuun vaihteessa
- ASUKASTILAISUUS LSL:n reitti- ja Aleksin remontti-info
  - toukokuun alussa
- UUTISOINTI TOUKOKUUSSA
  - Hämeenkadun järjestelyt voimaan 25.5. → viikkoa ennen siirtokehoitukset
  - Hämeenkadun bussireitti voimaan 1.6.
  - Aleksin suljetaan 3.6. , ja urakka alkaa 4.6. ( markkinapäivä 3.6.)
- URAKKAINFOT kesäkuussa – kaupunki julkaisee tärkeimmät vaiheet uutisena
  - Mahdollisuus liittyä urakkainfon jakelulistalle <https://link.webropol.com/s/aleksinurakka>
  - Työvaiheiden informointi ennakoivasti
  - Melua, hajua, pölyä aiheuttavat työvaiheet informoidaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen
- VESIJÄRVENKADUN ASFALTOINNIN JA PYSÄKKIKOKEILUN TYÖVAIHEET JUHANNUKSEN JÄLKEEN
  - Työvaiheet Vesijärvenkadulla, reittisuositukset
  - Pysäkkikokeilun alkaminen elokuun alussa:

# ***Kiitos!***

**Suunnittelu ja urakka**

**Petteri Väisänen, [+358444826410](tel:+358444826410), [Petteri.Vaisanen@lahti.fi](mailto:Petteri.Vaisanen@lahti.fi)**

**Liikennejärjestelyt**

**Juhana Polojärvi, [+358444826402](tel:+358444826402), [Juhana.Polojarvi@lahti.fi](mailto:Juhana.Polojarvi@lahti.fi)**
